AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. ÁREA DE MOVILIDAD Y ESPACIO URBANO. SERVICIO DE ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURAS. CENTRO DE CONSERVACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA.

LOTE 2 : CONSERVACIÓN REPARACIÓN Y REFORMA DE INFRAESTRUCCTURAS VIARIAS EN EL MUNICIPIO DE VALLADOLID, CUYO OBJETO PRINCIPAL SEA LA EXTENSIÓN DE AGLOMERADO ASFÁLTICO EN CALIENTE Y SUS UNIDADES ACCESORIAS

PROGRAMACIÓN 1ª CAMPAÑA AÑO 2022: ABRIL-JUNIO

CALLE	TRABAJO
ARANDANO II	sustituir adoquines por aglomerado
JOSE VELICIA	sustituir adoquines por aglomerado
PADRE LLANOS	sellado de fisuras + bacheo +slourry
CIUDAD DE LA HABANA I	carriles de subida fresado + aglomerado
CIUDAD DE LA HABANA II	carriles de subida fresado + aglomerado
CIUDAD DE LA HABANA III	carriles de subida sellado fisuras
CIUDAD DE LA HABANA IV	carriles de subida tramos fresado +aglom.+sellado de fisuras
JUAN MARTINEZ VILLERGAS	fresado + aglomerado
PROF. A. MIAJA DE LA MUELA	fresado + aglomerado aparcamientos
JOSÉ GARROTE TEBAR	fresado + aglomerado aparcamientos
FUENTE EL SOL	sellado de fisuras
NEPTUNO	fresado + aglomerado Europa-Júpiter +sellado de fisuras Júpiter-Monjas
SAN LAZARO	sellado de fisuras + bacheo tramos
JUPITER	fresado+geomalla+aglomerado
SOTO	sellado de fisuras + aglom intersec. C. Torquemada
MIRABEL	sellado de fisuras
PUENTE VALLE DE ARÁN	fresado + aglomerado
TIRSO DE MOLINA	sellado de fisuras
LOPE DE RUEDA	fresado +aglomerado
CARDENAL TORQUEMADA	sellado de fisuras
CHANCILLERIA	fresado + aglomerado tramos
RAMON Y CAJAL	fresado + aglomerado carril dereco con sobreancho + intersec. Paraiso
TEMPLARIOS	fresado+aglomerado
CIGÜEÑA	fresado + aglomerado
Cº MARTILLETE	sellado de fisuras hasta inter. Curruca y fresado +aglomerado el resto
PETIRROJO	sellado de fisuras + fresado + aglom. tramo Escribano - Jilguero
ABEJARUCO	sellado de fisuras
CURRUCA	sellado de fisuras
CARBONERO	sellado de fisuras
PICAPINOS	sellado de fisuras
JILGUERO	sellado de fisuras
HUELVA	frasado + aglom. Albacete - Cadiz + semicalzada Cadiz - Málaga
GERONA	sellado de fisuras Embaj. - Caamaño y fresado + aglom. hasta A. Real
CABO NOVAL	slourry carril pares y fresado + aglom. carril impares + aparcamiento
HOSPITAL MILITAR	sellado fisuras + slourry 4 carriles y fresado + aglom. aparc.+ nuevos c. bici
Pº ZORRILLA V.SERV. TRAMO 1	fresado +aglomerado
Pº ZORRILLA V.SERV. TRAMO 2	fresado +aglomerado
Pº ZORRILLA V.SERV. TRAMO 3	fresado +aglomerado
GABILONDO	fresado + aglomerado de Norte a Domingo Martínez
Pº ZORRILA GLORIETA CINE	fresado +aglomerado
MOTA	fresado + aglomerado + saneo de firme
MONTES Y MARTIN BARO	fresado + aglomerado de Wamba a L. Bellogín
FINAL	sellado de fisuras
CARRIL BICI AV. ZAMORA	reparación tramos aglom. + tratamiento superf. Av. Segovia - P. Jalón
MARTIN SANTOS ROMERO	slourry
FELIPE RUIZ MARTIN	slourry
AV. SANTANDER	slourry
AV. ZAMORA -TRONCO	slourry Av. Salamanca a paso elevado FF.CC.

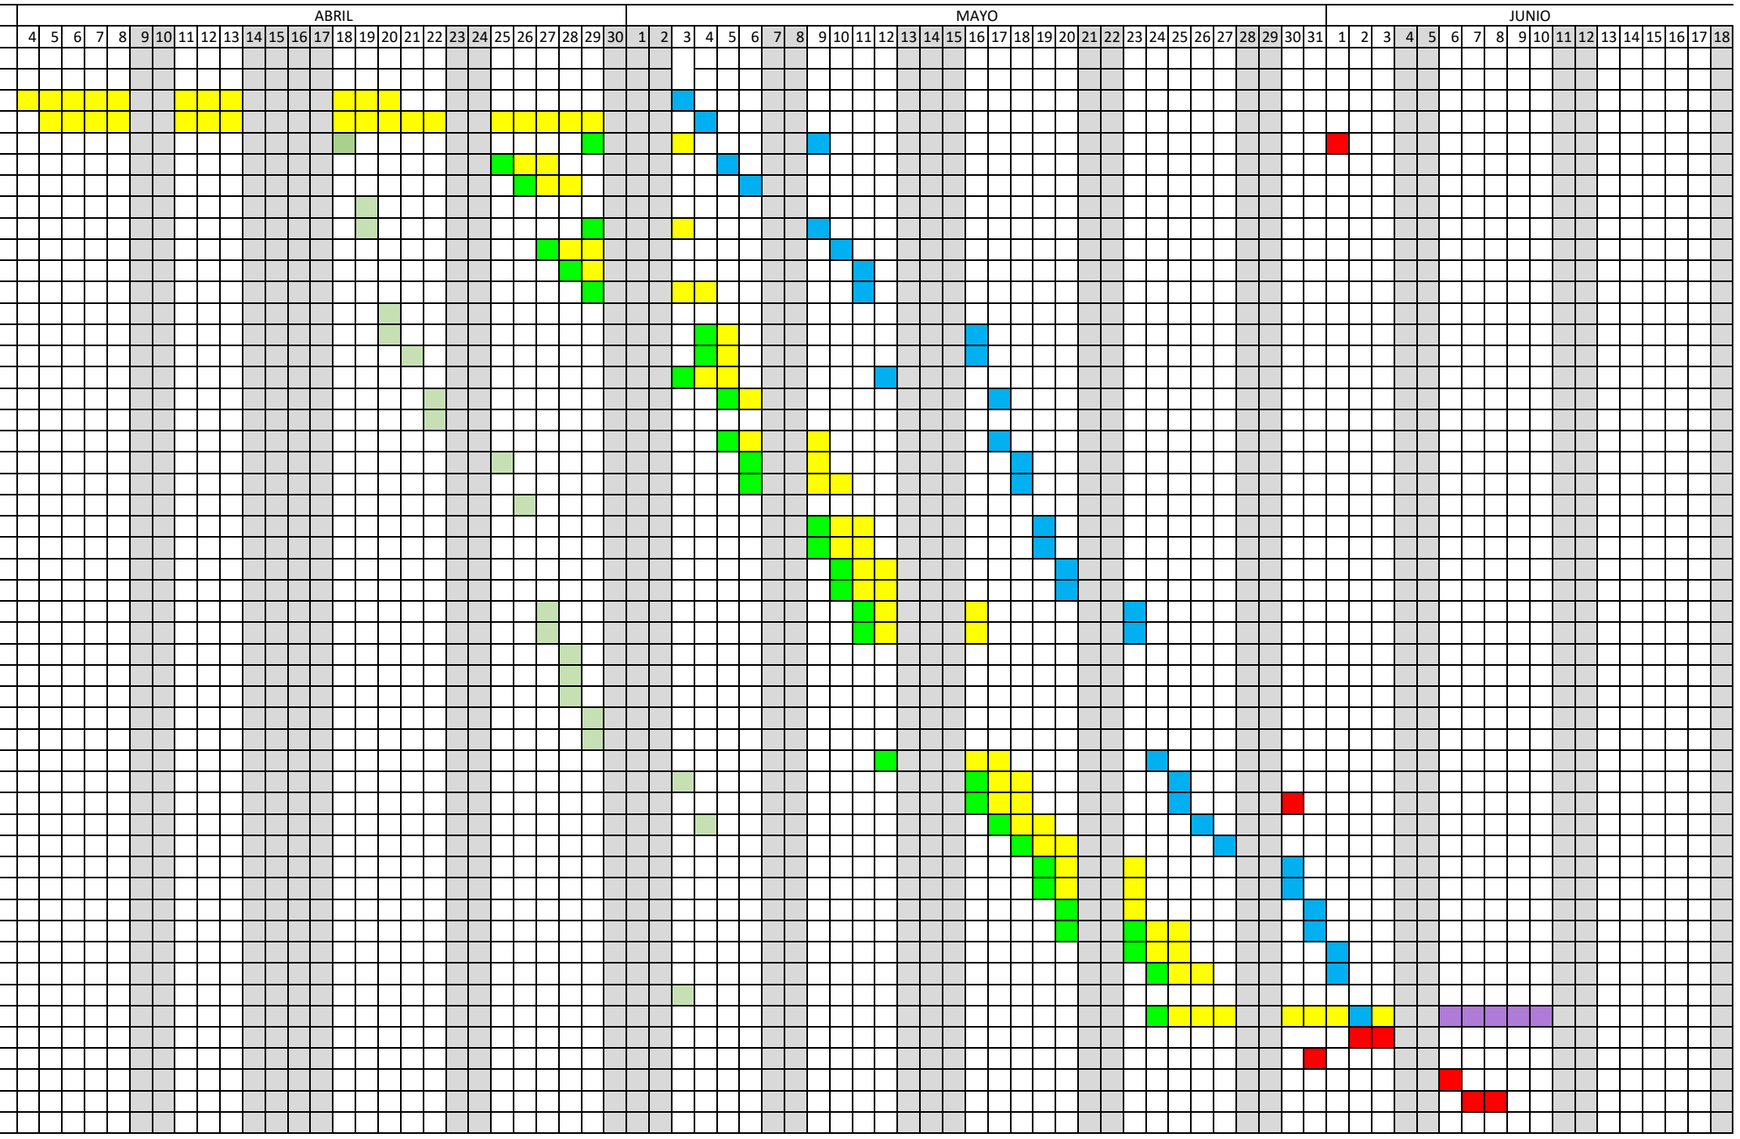

22 Día festivo | 45 Actuaciones previas | 20 Fresado de firme | 22 Asfaltado diurno | 0 Asfaltado nocturno | 12 Sellado de fisuras | 7 Microaglomerado en frio (Slourry) | 5 tratamiento superficial en verde
